


Visualização do Plano de Ação através do Diagrama de Gantt

O **Diagrama de Gantt** é um gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projeto (entendido neste sistema como um **Plano de Ação**). Este diagrama mostra os intervalos de tempo representando o início e fim de atividade do Plano através de barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

Para visualizar o *Diagrama de Gantt* de um **Plano de Ação**, você deve selecioná-lo e, em seguida, clicar no item de menu "*Pacotes de trabalho*" no menu lateral esquerdo, conforme imagem abaixo:

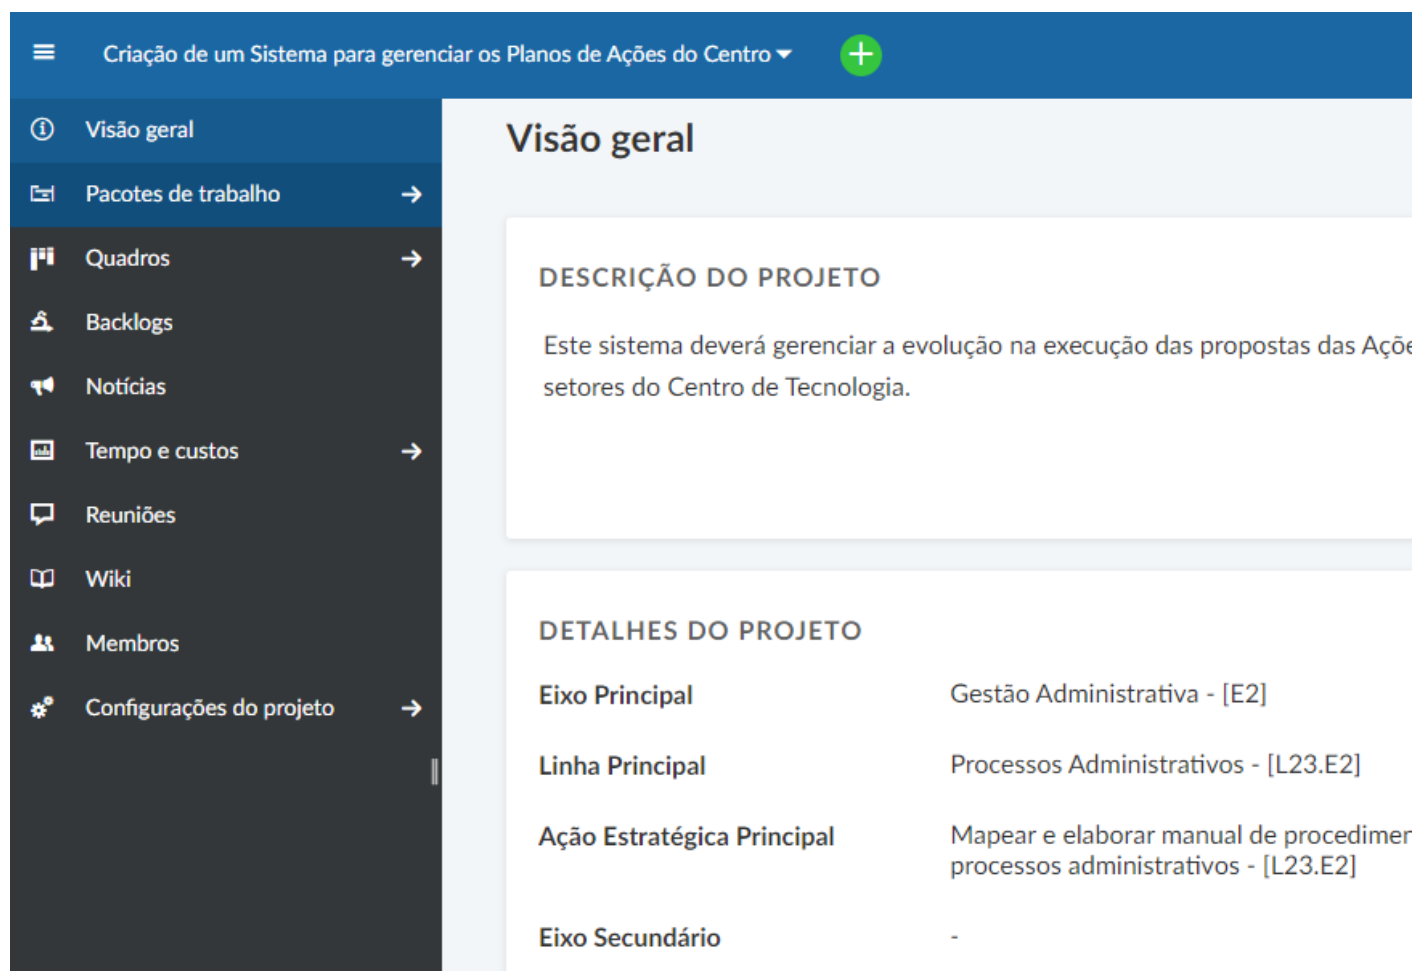

Visão geral

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este sistema deverá gerenciar a evolução na execução das propostas das Ações setores do Centro de Tecnologia.

DETALHES DO PROJETO

Eixo Principal	Gestão Administrativa - [E2]
Linha Principal	Processos Administrativos - [L23.E2]
Ação Estratégica Principal	Mapear e elaborar manual de procedimento processos administrativos - [L23.E2]
Eixo Secundário	-

A tela com todas as atividades do Plano de Ação será aberta. Clique no item de menu "Gráfico de Gantt" no menu lateral esquerdo.

Criação de um Sistema para gerenciar os Planos de Ações do Centro

Pesquisar ...

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^ PRIVADO

New manually sorted query

Todos abertos

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Tabela

ID ↑	ASSUNTO	TIPO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	PROGRESSO (%)	DURAÇÃO	
735	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema	TAREFA	09/03/2023	21/03/2023	100%	9 dias	
736	Pesquisar por softwares de gerenciamento de atividades/projetos	TAREFA	21/03/2023	27/04/2023	100%	28 dias	
737	Estudo sobre recursos e infraestrutura a serem utilizados no sistema	TAREFA	07/04/2023	26/04/2023	100%	14 dias	
738	Escolha do software	MARCO	26/04/2023	26/04/2023	100%		
739	Parametrização do Ambiente de acordo com a Carta Programa do Centro de Tecnologia e PDTI da UFPB	TAREFA	27/04/2023	17/05/2023	100%	15 dias	
740	Criação de usuários e setores	TAREFA	12/05/2023	26/05/2023	100%	11 dias	
741	Importação dos Planos de Ações a partir da planilha de gerenciamento criada pela Direção de Centro	TAREFA	23/05/2023	27/06/2023	100%	26 dias	
742	Realização de Testes Alfa	TAREFA	13/06/2023	06/07/2023	100%	18 dias	
743	Implantação do Sistema para períodos de testes	MARCO	20/06/2023	20/06/2023	100%		
744	Realização de treinamento dos usuários	TAREFA	27/06/2023	28/06/2023	100%	2 dias	
745	Realização de Testes Beta	TAREFA	28/06/2023	27/07/2023	100%	22 dias	
746	Implantação Oficial do Sistema	MARCO	28/07/2023	28/07/2023	100%		

+ Criar novo pacote de trabalho

O sistema irá exibir o **Gráfico de Gantt** do Plano de Ação selecionado, conforme imagem a seguir:

Pacotes de trabalho

Pesquisar

^ PADRÃO

Todos abertos

Última atividade

Criado recentemente

Gráfico de Gantt

Atrasado

Sumário

Criado por mim

Atribuído a mim

^ PRIVADO

New manually sorted query

Gráfico de Gantt

+ Criar

Incluir projetos 1

Filtro 1

Gr/Gantt

ID	TIPO	ASSUNTO
735	TAREFA	Pesquisa e Estudo de Viabilidade do Sistema
736	TAREFA	Pesquisar por softwares de g
737	TAREFA	Estudo sobre recursos e infr
738	MARCO	Escolha do software
739	TAREFA	Parametrização do Ambiente
740	TAREFA	Criação de usuários e setore
741	TAREFA	Importação dos Planos de A
742	TAREFA	Realização de Testes Alfa
743	MARCO	Implantação do Sistema para
744	TAREFA	Realização de treinamento d
745	TAREFA	Realização de Testes Beta
746	MARCO	Implantação Oficial do Siste

+ Criar novo pacote de trabalho

2023

09/03/2023

21/03/2023

07/04/2023

26/04/2023

27/04/2023

17/05/2023

12/05/2023

26/05/2023

23/05/2023

27/06/2023

13/06/2023

06/07/2023

20/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

27/07/2023

28/07/2023

Revisão #4
Criado 29 agosto 2023 19:26:13 por Klebber de Araújo Pedrosa
Atualizado 29 agosto 2023 20:35:31 por Klebber de Araújo Pedrosa
